

＜令和5年度新曙橋(P2橋脚)耐震補強工事に伴う準備工事＞ 工事概要書

工事件名 : 令和5年度新曙橋(P2橋脚)耐震補強工事に伴う準備工事

施工場所 : 東京都江東区辰巳三丁目地先

工期 : 自) 令和6年2月5日 至) 令和7年2月10日

- 工事概要 :
- (1) 土工
 - 床掘工 2,069m³
 - (2) 仮設工
 - 鋼管矢板打設 φ800×t9×28.5m 43本
 - 鋼管矢板打設 φ800×t10×28.5m 55本

工事内容 : 本工事は、既設橋脚(新曙橋)の耐震補強工事の準備工事であり、土工及び仮設工を行うものである。

発注者 : 東京都港湾局 東京港建設事務所 港湾整備課(道路整備担当)
TEL 03-5500-3224

総括監督員 高田 潤一郎
主任監督員 堤 洋平
担当監督員 柴垣 太郎

施工者 : 北野建設株式会社
現場代理人 石上 康太 携帯TEL 080-2640-5534
監理技術者 石川 大貴 携帯TEL 080-1053-5989

施工位置図




工程表


工種	2024年												2025年			
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月			
海上作業																
準備工																
床掘工																
仮設工																
警戒船																
片付工																

※上記の工事工程は、台船の確保、天候、工事中止期間の影響により、変更が生じる場合があります。

断面図

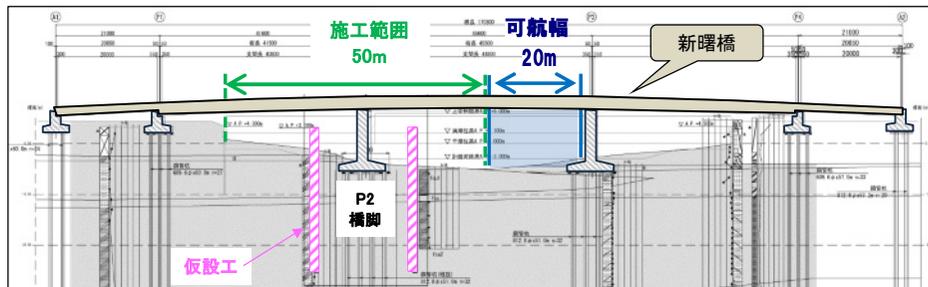

平面図

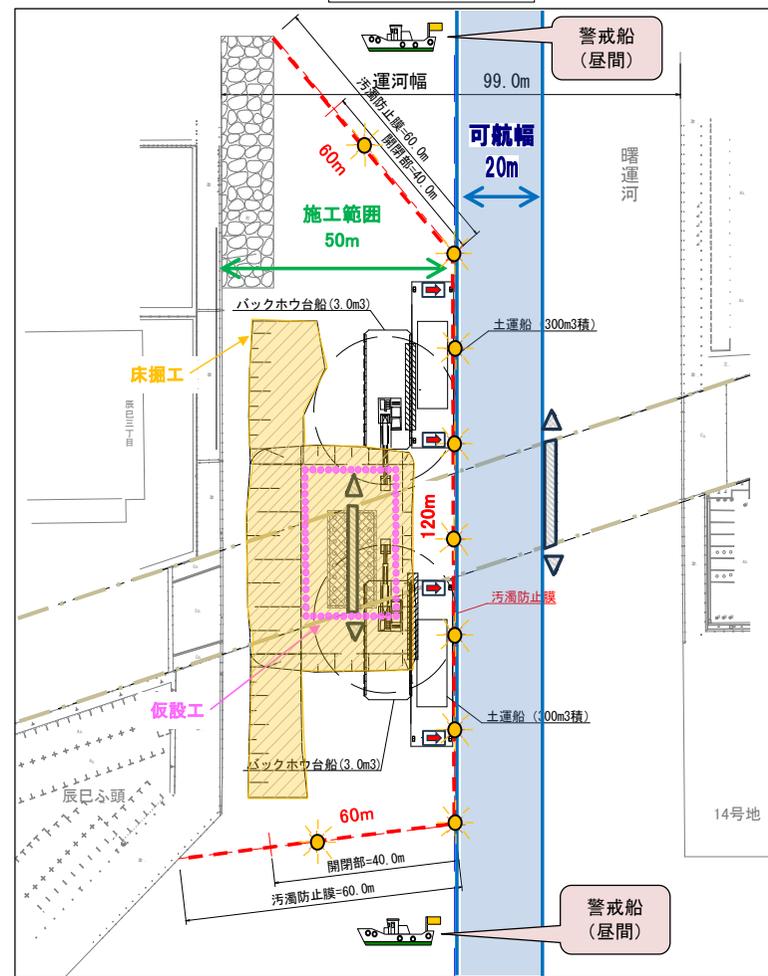

【イメージ写真】
ソーラー式矢印板



※航路側船の両端に設置

【イメージ写真】
小型灯浮標



※航路側汚濁防止膜に20m間隔で設置
