


工事概要書【令和6年度第三航路しゅんせつ工事】

1. 工事概要

- (1) 工事件名 令和6年度第三航路しゅんせつ工事
- (2) 工事場所 東京都江東区海の森三丁目地先
- (3) 工期 全体工期 令和6年11月15日～令和7年03月28日
海上工事期間 令和6年12月16日～令和7年03月28日(予定)
- (4) 作業時間 日の出～日没
- (5) 工事内容 しゅんせつ工
しゅんせつ深度 A.P.-12.0m
しゅんせつ対象範囲 12,042m²
グラブしゅんせつ 31,360m³
潜水探査 一式
安全対策(警戒船配備) 一式
- (6) 安全対策
・警戒船は、しゅんせつ区域に2隻/日、配備します(S型1隻・N型1隻)
・夜間停泊時は周辺航行船舶から目視できるよう点滅灯を作業船四隅に設置します。
・作業船団及び警戒船と連絡を密にとり安全確保に努めます。
- (7) 発注者 東京都東京港建設事務所 浚渫工事課
(監督部署) TEL:03-3471-0883 FAX:03-3471-0727
- (8) 受注者 峰岸浚設株式会社
〒104-0042 東京都中央区入船1丁目1番21号
TEL:03-3552-9871 FAX:03-3552-9878
現場代理人兼監理技術者 池田 学 (携帯:080-9027-5657)


2. 施工位置図

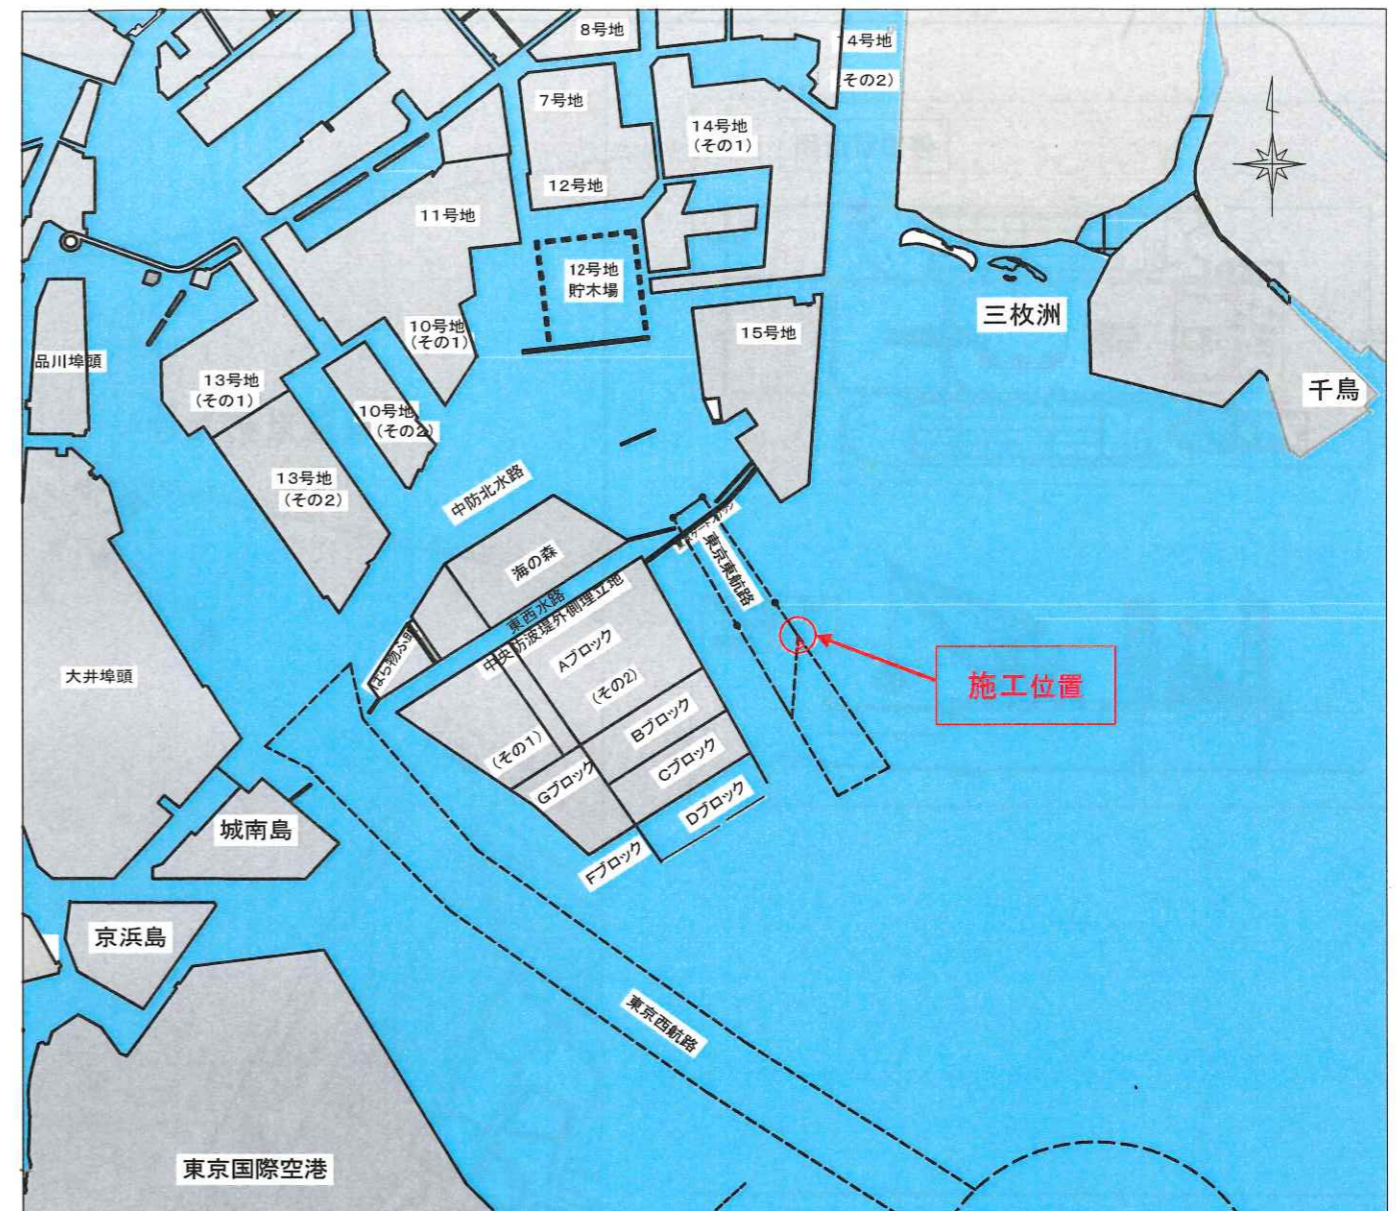

3. 工事工程表




工種	単位	数量	令和6年			令和7年												
			11月	12月	1月	2月	3月											
			10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	29	10	20	31	
準備工	式	1	[Bar]															
浚渫工 グラブ浚渫	m ³	31,360																
土運搬運搬工	m ³	31,360																
測量工	式	1																
潜水探査	式	1																
安全対策 警戒船配備	式	1																
後片付け	式	1																

海上作業期間 R6.12.16～R7.3.28

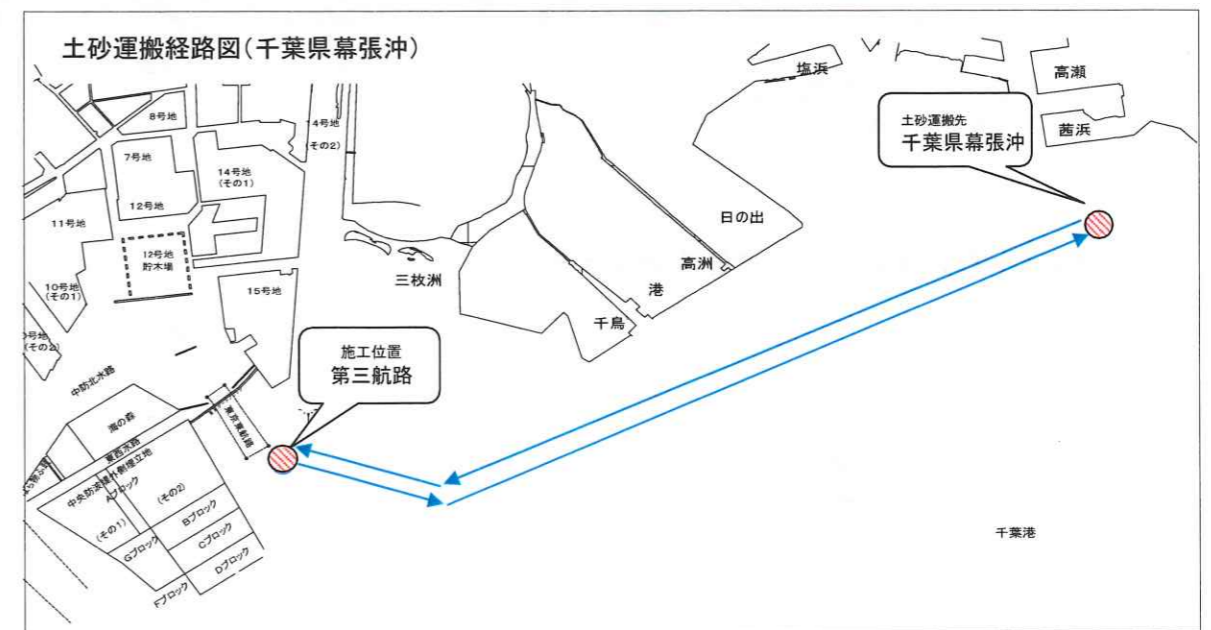

工事概要書【令和6年度第三航路しゅんせつ工事】

しゅんせつ工 施工状況図
(令和7年2月中旬～3月中旬 予定)

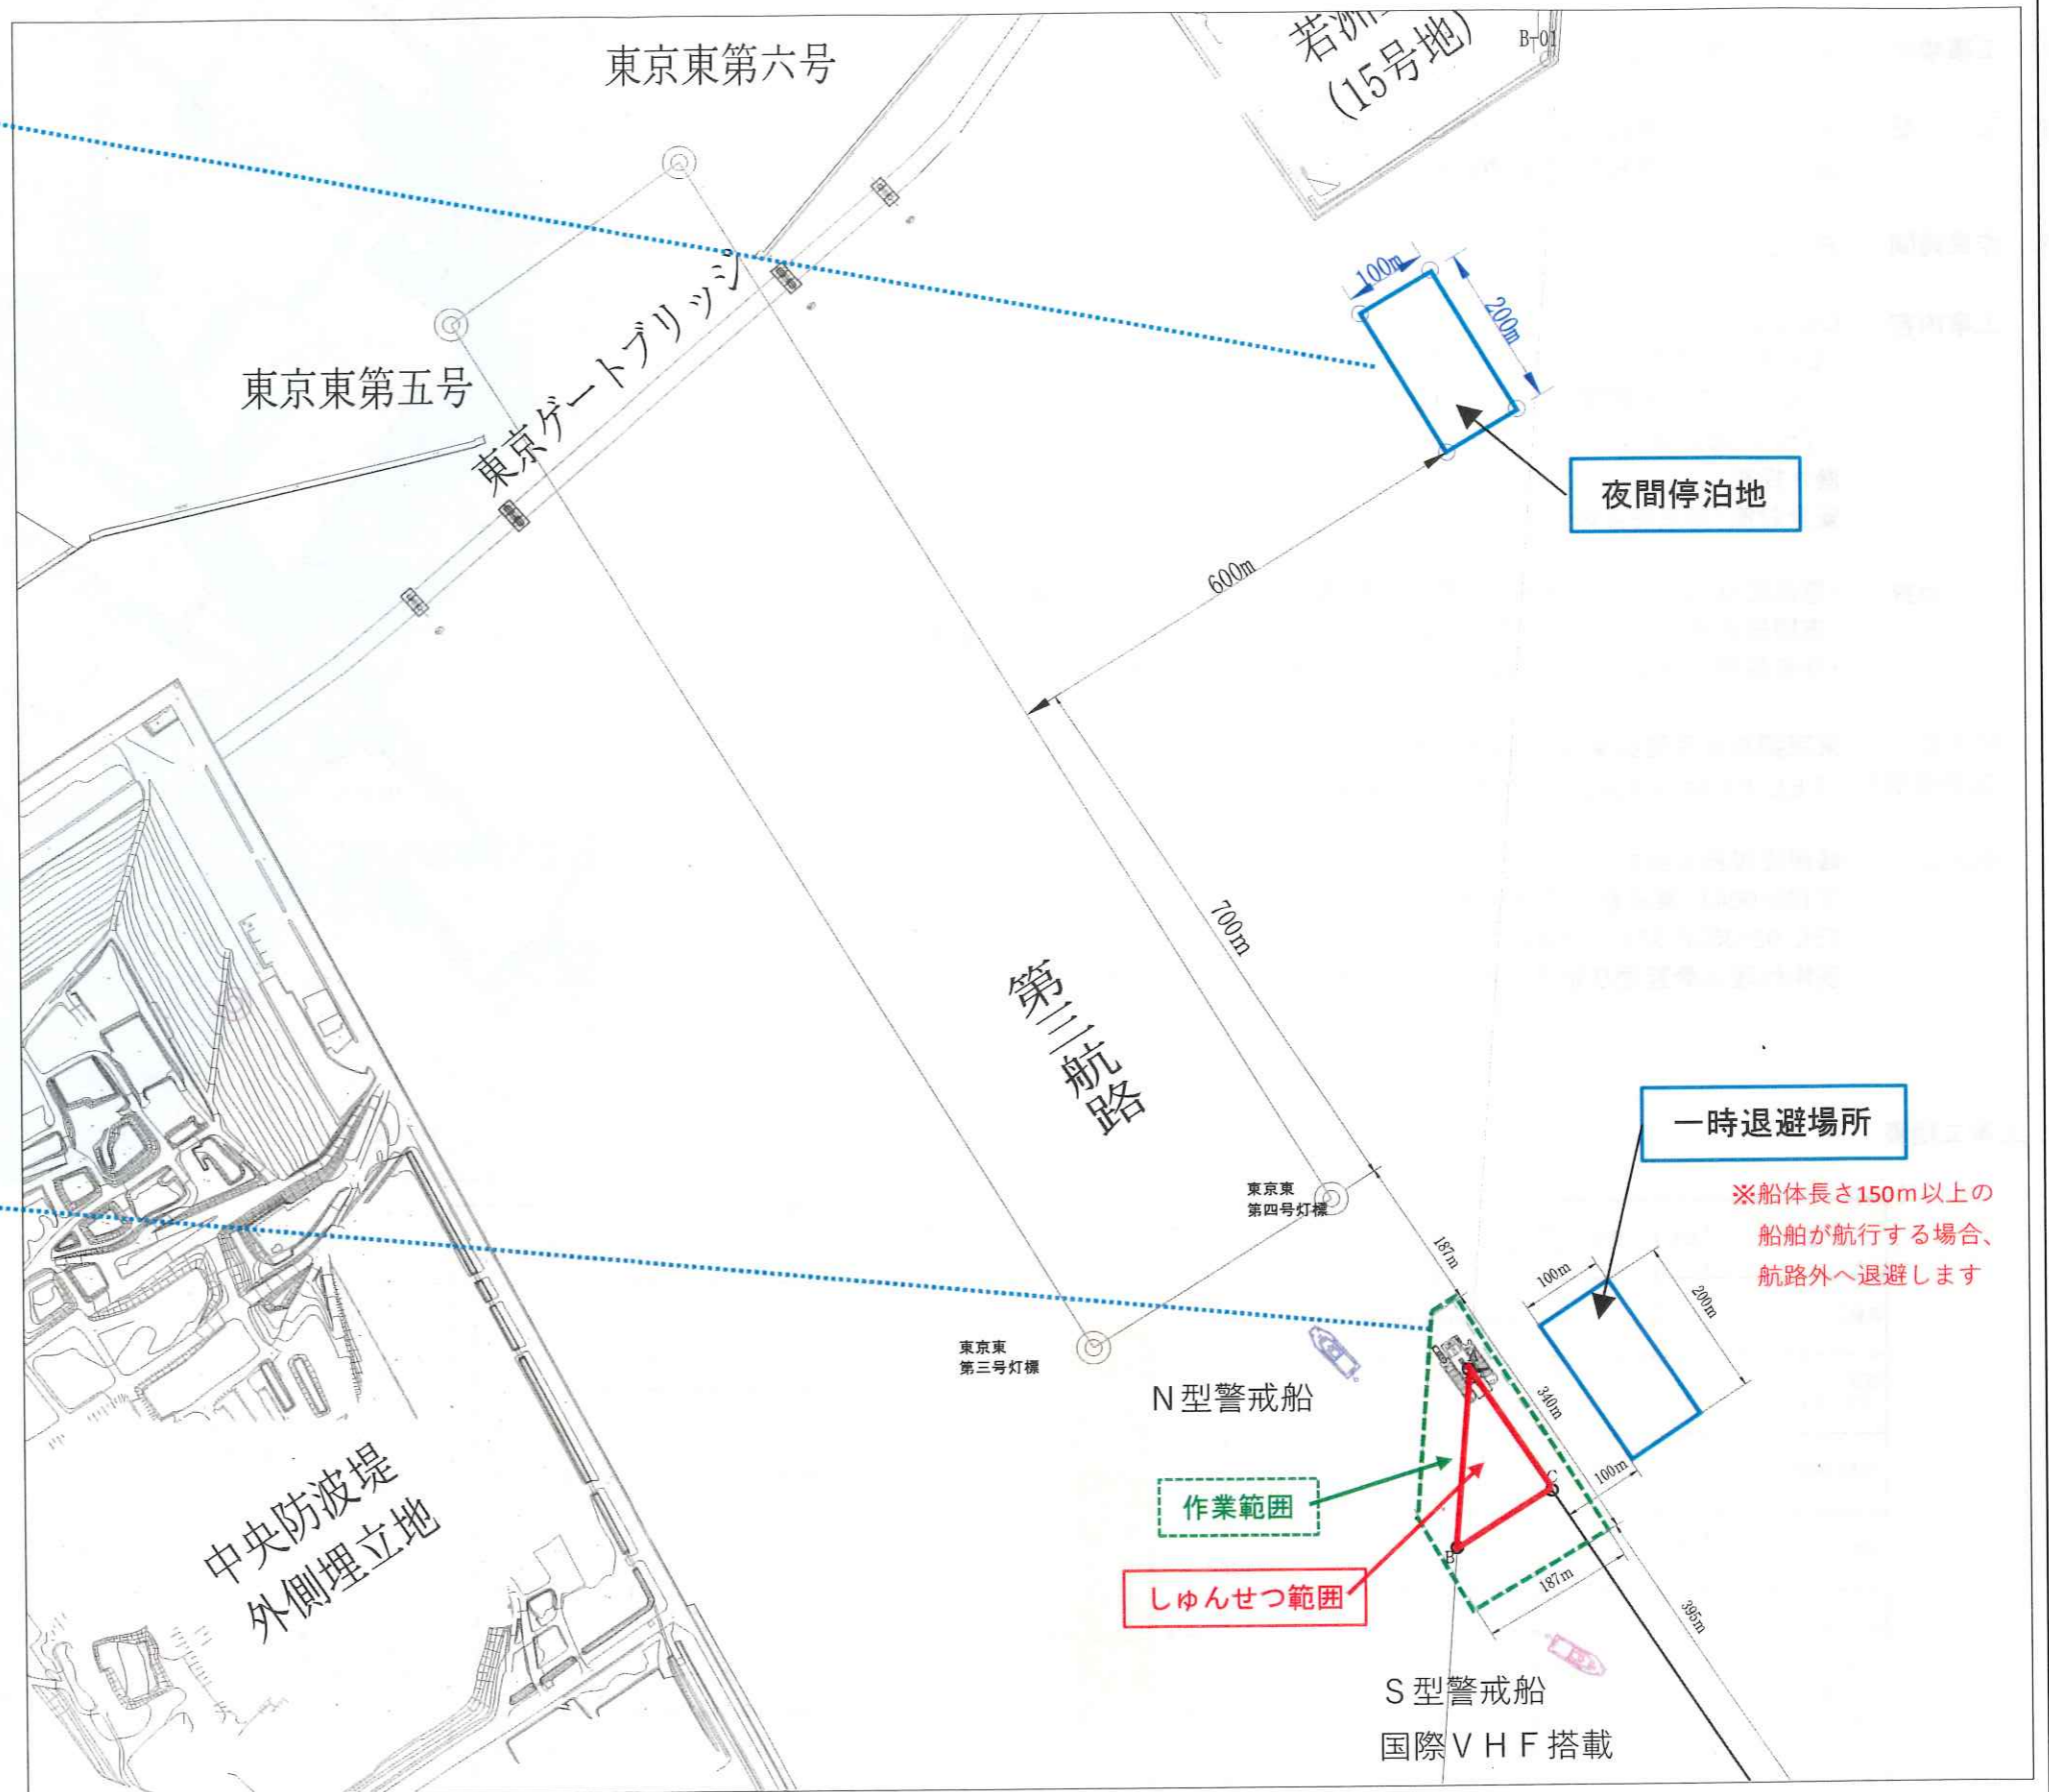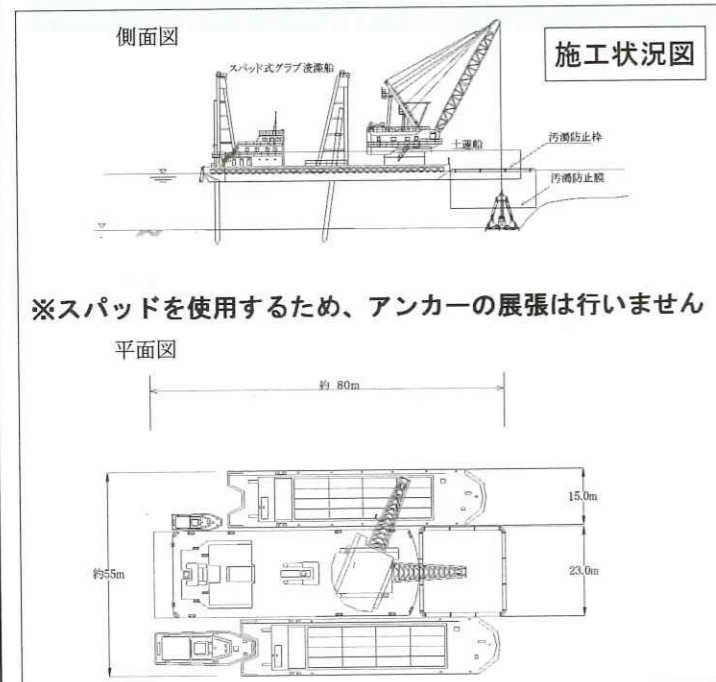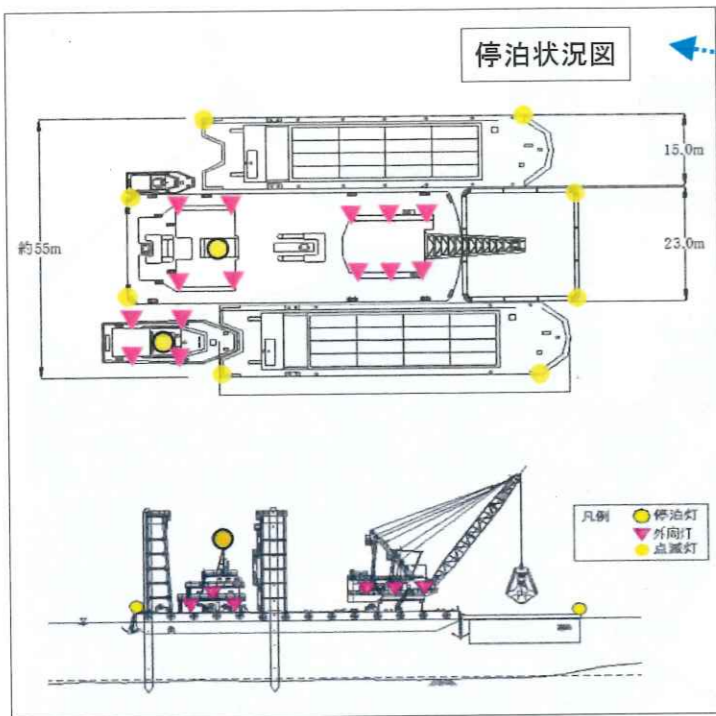

※船体長さ150m以上の船舶が航行する場合、航路外へ退避します
