東京夢の島マリーナ浮桟橋改修工事　　実施工程表

2024年7月17日
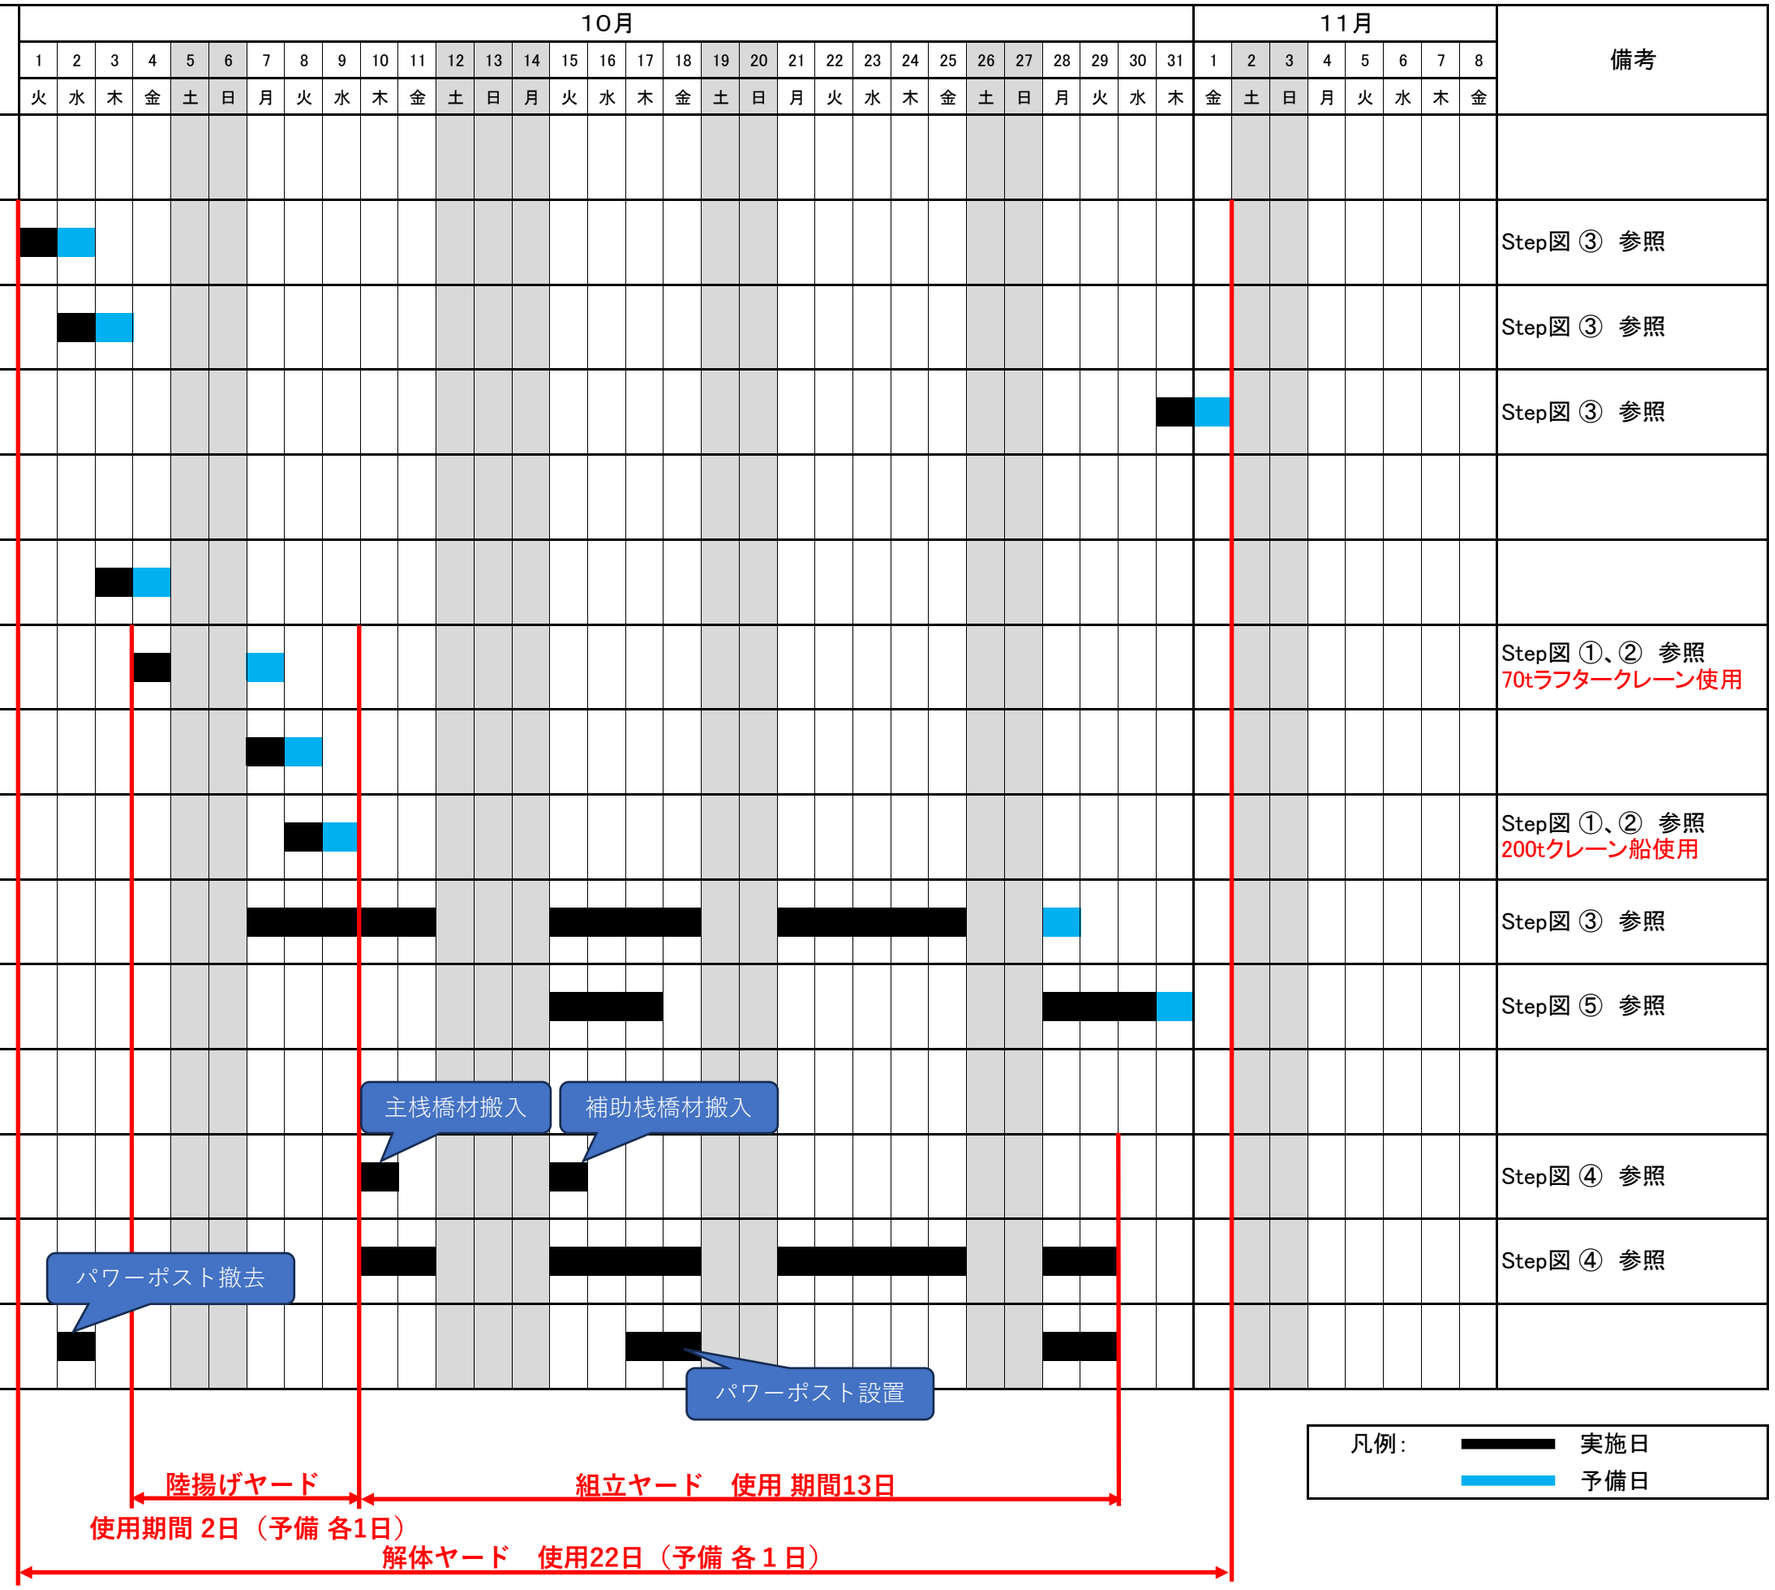
工種	施工内容・場所 ※(　)内は施工場所です	備考
準備工		
	現場事務所設置（解体ヤード） 仮囲い材搬入（陸揚げヤード、解体ヤード）	Step図 ③　参照
	敷鉄板搬入・設置（解体ヤード）	Step図 ③　参照
	敷鉄板撤去・搬出（解体ヤード）	Step図 ③　参照
既設浮桟橋撤去工		
	補助桟橋撤去（B、Nバース）	
	補助桟橋曳航・場内運搬 （陸揚げヤード、解体ヤード）	Step図 ①、②　参照 70tラフタークレーン使用
	主桟橋撤去（Bバース）	
	主桟橋曳航・場内運搬 （陸揚げヤード、解体ヤード）	Step図 ①、②　参照 200tクレーン船使用
	既設桟橋解体・清掃（解体ヤード）	Step図 ③　参照
	既設桟橋積込・処分（解体ヤード）	Step図 ⑤　参照
浮桟橋設置工		
	浮桟橋材搬入（組立ヤード）	Step図 ④　参照
	浮桟橋組立・設置（組立ヤード）	Step図 ④　参照
	付属物撤去、設置（Bバース）
